Klubbhus Bil. 1

LUNDQVIST TRÄVARU AB

SIDA:	1/1
OFFERTNUMMER:	5228
DATUM:	2017-02-06
OFFERT GILTIG TOM:	2017-03-08

OFFERT

Bror Jansson
lotsvägen 28
18492 Åkersberga

VÄGGAR

Stuga 6.1 x 10.1 m utv. panel. (Grundyttermått 6 x 10 m).
Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 2.5 m) med standardpanel och vindduk.
Väggreglar 45x195, väggblock anpassas med extra luftning.
Knutbrädor, vindskivor, takfotsbrädor, foder, underspikning, hammarband,syll.
Till innerväggar 11 m.m. OSB-skiva.
Till innerväggar 13 m.m. gipsskiva.

TAK

Takstolar 22° Sadeltak för snözon 2.5 m. lätt tak, färdiga gavelspetsar.
Råspont 20mm (luckor), Strö o Bärläkt, Underlagspapp T-Tak Domo
Till innertak 13 m.m. gipsskiva
Benders ytbehandlade palemapannor (svart) 2-kup. med tillbehör
Takavvattningssystem (svart) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

FÖNSTER, DÖRRAR OCH PORTAR

3 st Fönster 9x13 (vit) 3-glas fast (trä)
2 st Fönster 9x13 (vit) 3-glas vrid (trä)
1 st Ytterdörr 9x21 (vit) med fönster (Lapporten 18°) (Obestämd hängning)

GRUND

Egen grundläggning

ÖVRIGT

Isoleringspaket (195 vägg, 240 tak) avropas, leveranstid 1-2 veckor, inkl. mellanreglar c/c 600, ångspärr till väggar, glespanel, ångspärr, vindavledare till tak
Grundmålning av panel (röd oljegrundfärg).
Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag, insektsnät m.m.

Exkl: Dörrhandtag, låscylinder, bleck m.m.
OBS! Viktigt med vindavstyvning!

Pris:	179 200 kr inkl. moms
Frakt:	6 300 kr inkl. moms

Leveransvecka:	Enligt överenskommelse
Betalningsvillkor:	Före leverans eller mot efterkrav (+400:-)
Leveransvillkor:	Levererat olossat köpare
Offererat av:	Victoria Danstål

Klubbhus Bil. 2

montage - Bror Jansson.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

digera Visa Fönster Hjälp

Verktyg Offert montage - B... ×

Lundqvist Trävaru AB

Datum 2017-03-15

Offert på montage

Bredd: 6 m
Längd: 10 m
Höjd: 2,5 m
Taklutning: 22°

Bror Jansson
Åkersberga

För att underlätta byggprocessen kan vi även bistå med montage för våra byggsatser - ett prisvärt alternativ om du inte önskar montera byggsatsen helt själv.

Montage +85900:- inkl. moms

Montage med utgångspunkt i våra byggsatser innebär att byggnaden monteras väderskyddad utvändigt. Detta innefattar montering av väggsektioner, takstolar, gavelspetsar, knutbrädor, vindskivor, takfotsbrädor, råspont, papp, strö/bärlakt och underspikning.

Montering av följande tillkomer som tillval:

- Montage av yttertak inkl. gavelbeslag och takfotsplåtar +12400:- inkl. moms
- Montage av takavvattning +3700:- inkl. moms
- Montage av fönster inkl. foder (exkl. plåtbleck) +1400:-/st inkl. moms
- Montage av ytterdörr inkl. foder (exkl. plåtbleck) +1000:-/st inkl. moms
- Montage av isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar +10200:- inkl. moms
- Montage av OSB skivor och gipsskivor. Vägg och tak. 12000:- inkl. moms
- *Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare*

Övriga förutsättningar och reservationer

Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:

- Byggström
- Ombesörjer att byggavfall tas om hand
- Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele med mera
- Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
- Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggplatsen
- Svarar för snöröjning

Leverans- och montagetid

Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montörer samt montageansvarig hos Lundqvist Trävaru AB. Byggsatsen levereras normalt sett någon vecka innan montage. Från första montagedagen skall montaget vara färdigställt inom 2 veckor, om inte annat överenskommits eller speciella omständigheter föreligger.

Klubbhus Bil 3

Offert.

Ingår i offert:

på gjutning bet. grund ca 60m² 10cm, 10cm isolering, armering 6150 + i borrning 12mm i hantbalk borrning 2 hål 150 ø avlopp + vatten. Grävning ca 10m avlopp, vatten., asfalttering.

Team Måhlin
Mark & asfalt AB
Vargmötesvägen 15
VALLENTUNA
TEL. 08-511 704 28
Org. 556587-3007

Pris 89'000 + mom

Invändig spackling + målning av Klubbhus
Ca 30'000 kr, inkl moms.

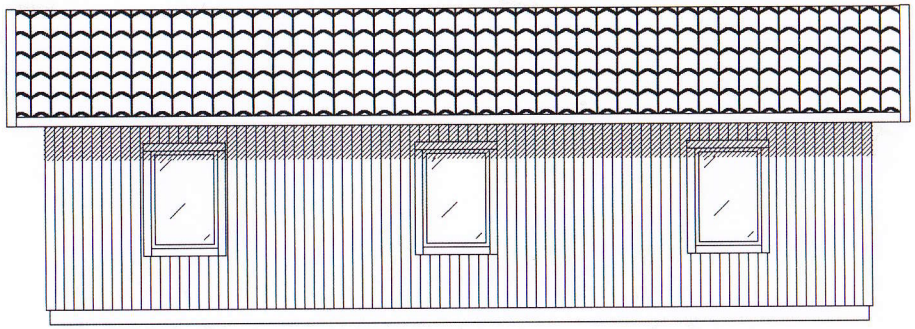

FASAD MOT

MOD. 6010825–22 FASAD		
RIT.	ORT/DATUM	SKALA 1:100

LUNDQVIST TRÄVARU AB

Klubbhus Bil 4

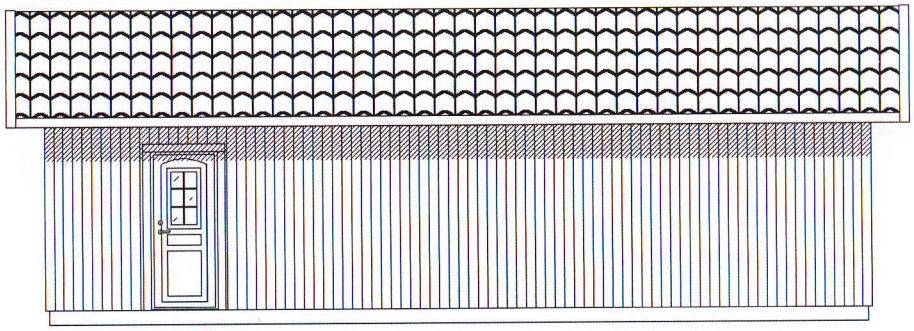

FASAD MOT

MOD. 6010825-22 FASAD		
RIT.	ORT/DATUM	SKALA 1:100

LUNDQVIST TRÄVARU AB

Klubbhus Bil 5

LUNDQVIST TRÄVARU AB

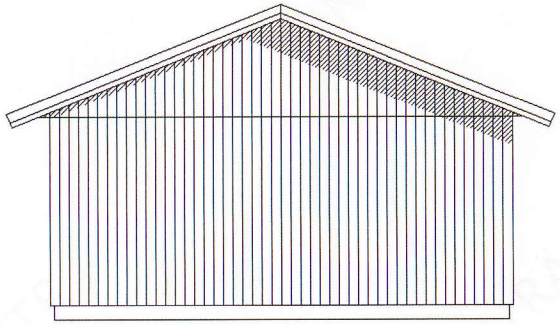

FASAD MOT

MOD. 6010825-22 FASAD		
RIT.	ORT/DATUM	SKALA 1:100

LUNDQVIST TRÄVARU AB

Klubbhus Bil 6

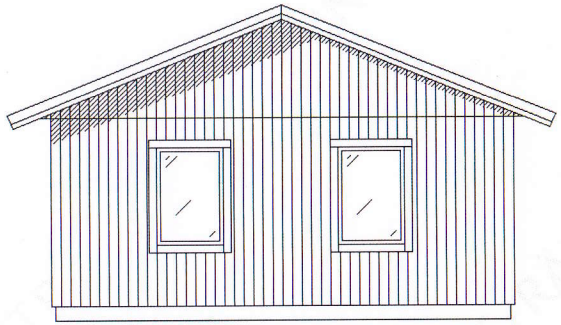

FASAD MOT

MOD. 6010825-22 FASAD		
RIT.	ORT/DATUM	SKALA 1:100

LUNDQVIST TRÄVARU AB

Klubbhus Bil 7

LUNDQVIST TRÄVARU AB

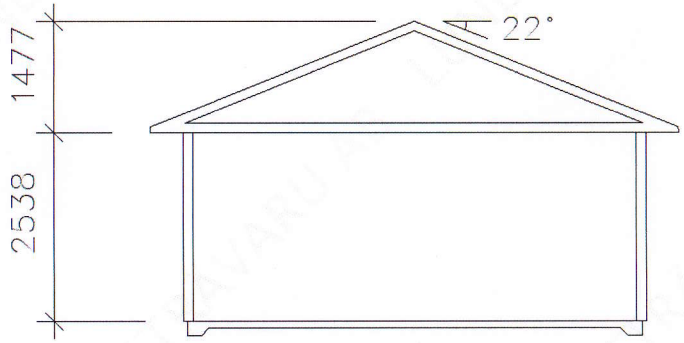

MOD. 6010825–22 SEKTION		
RIT.	ORT/DATUM	SKALA 1:100

LUNDQVIST TRÄVARU AB

Kubbhus B18

OBS! Grundmått 6000 x 10800 mm

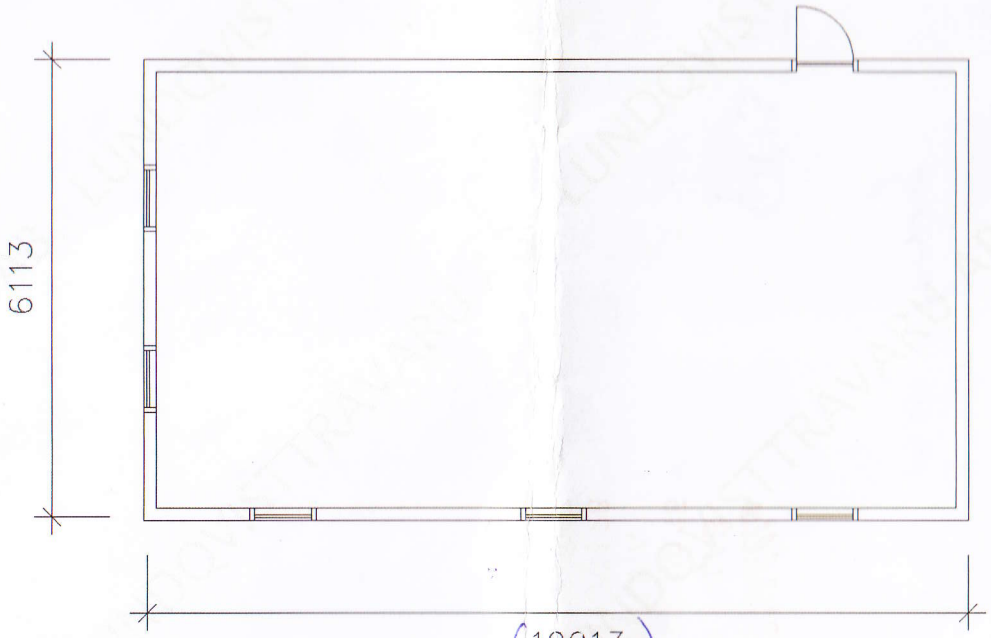

MOD. 6010825-22 PLAN		
RIT.	ORT/DATUM	SKALA 1:100

LUNDQVIST TRÄVARU AB

Klubbhus Bil 9

Ritningar över gamla klubbhuset samt förråd..

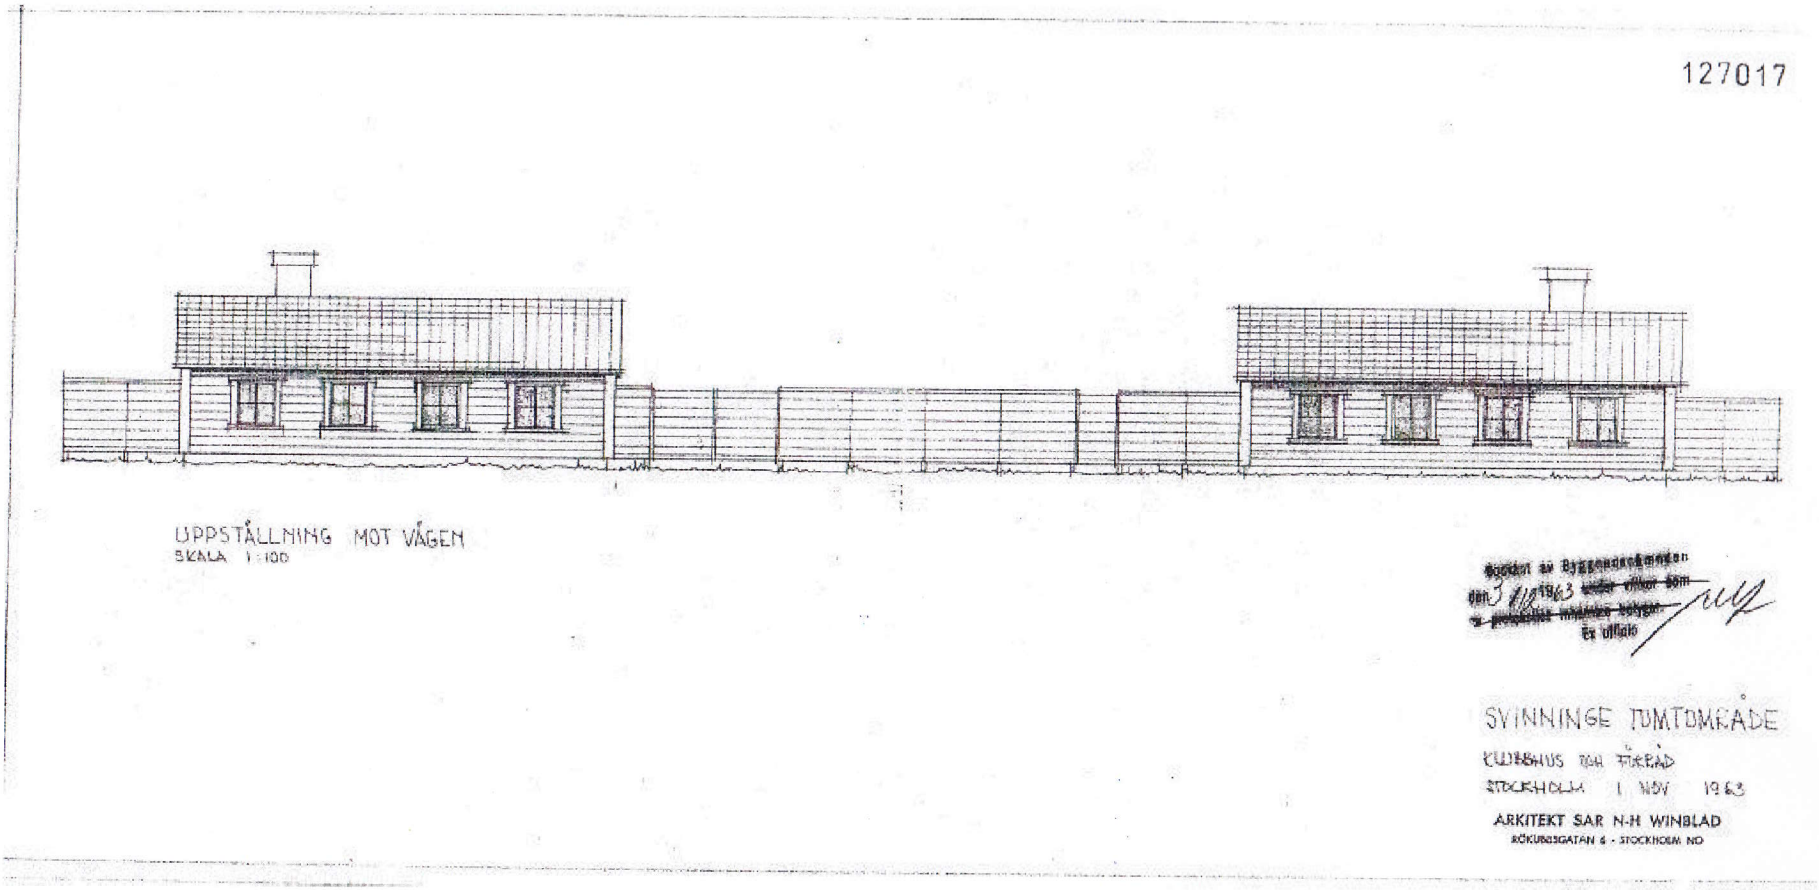

Klubbhus Bil 10

Klubbhus Bil 11

127018

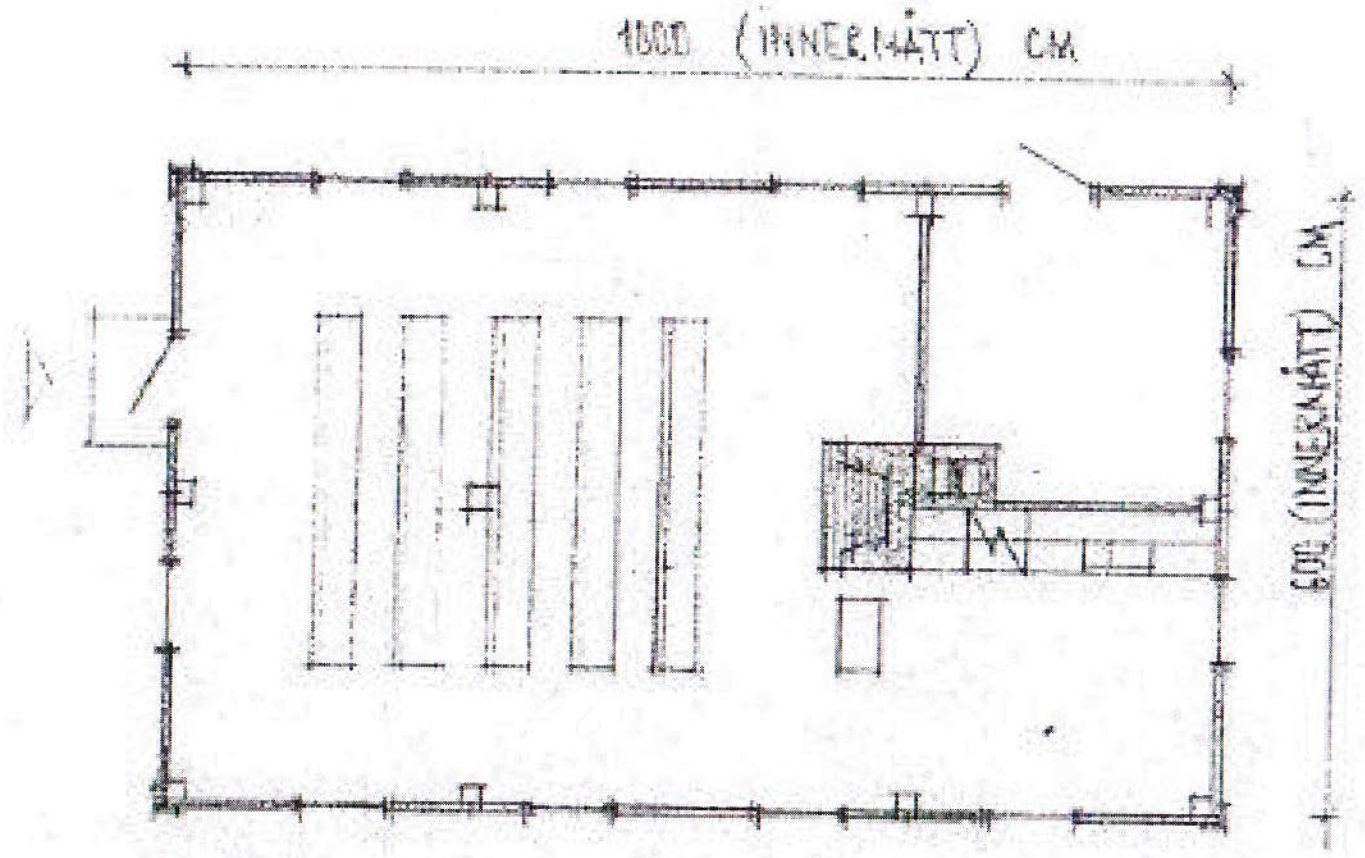

PLAN

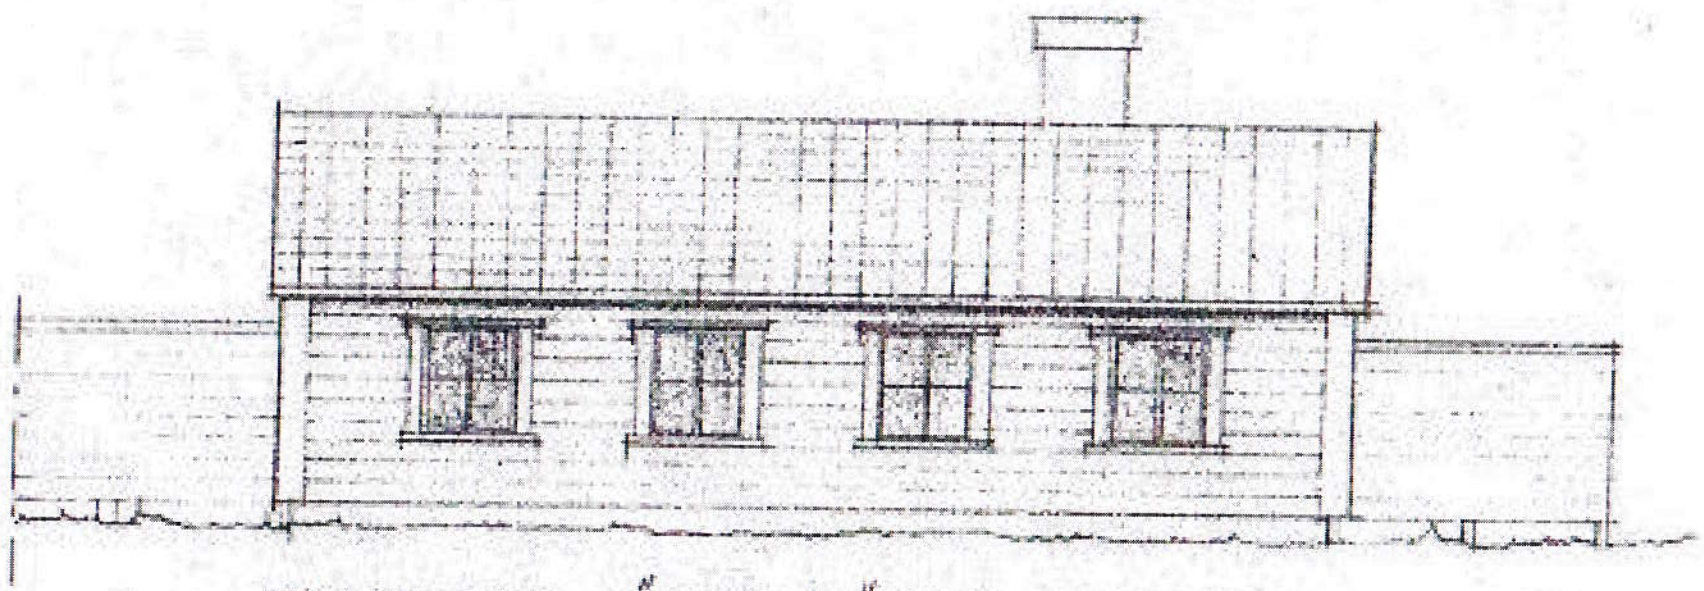

FASAD MOT SÖDER (VÄGEN)

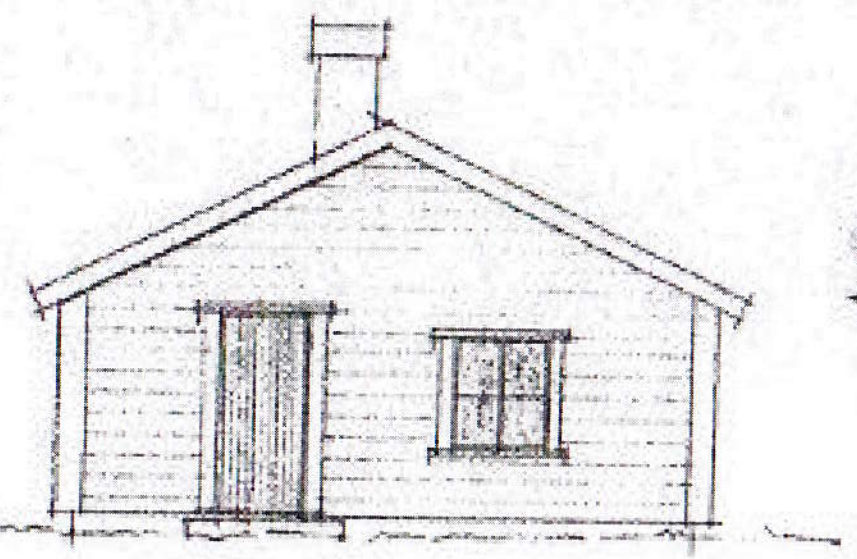

ENTRÉ-GAVEL

Godkänt av Byggnadsnämnden
den 3/12 1963

SYINNINGE TOMTOMRÅDE

127020

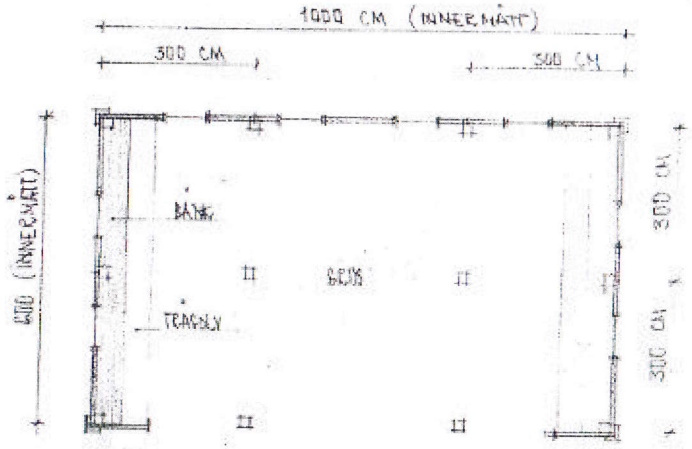

PLAN
SKALA 1:100

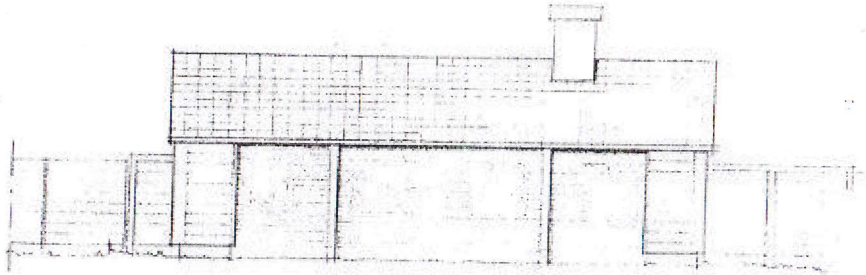

FASAD MOT NORR (SJÖN)

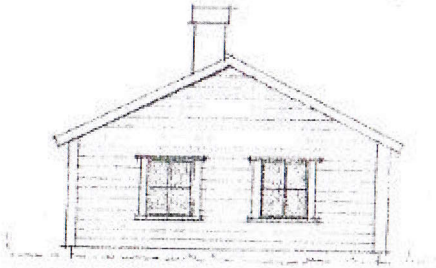

GAVELFASAD

Godkänt av Bygnadsnämnden
den 3/12 1963 under villkor som
av [illegible] betygar.
Ex officio

SVINNINGE TOMTOMRÅDE

FÖRRÅD VID BÅTHAMNEN

Klubbhus Bil 12

127019

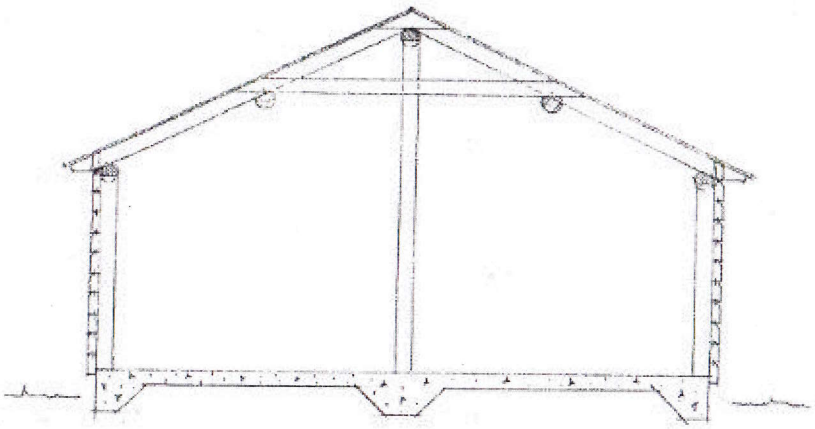

SEKTION GENOM KLUBBHUS
SKALA 1:50

TAKSTOL : REGAR 2"×6" c/c 120 CM
PELARE : DIMENSION 7"×7"
GOLV : BETONGPLATTA

Godkänt av Byggnadsnämnden
den 3/12 1963 under villkor som
av protokollet framgår bifogas.
Ex officio

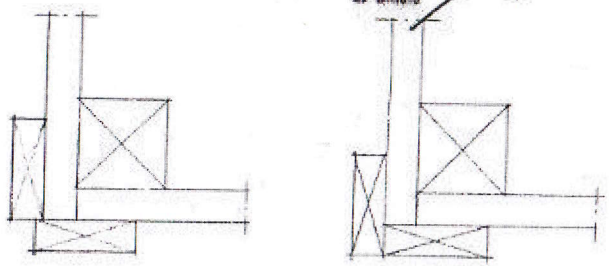

ALTERNATIV UTFORMNING AV LUCKNOT
SKALA 1:10

SVINNINGE TOMTOMRÅDE

KLUBBHUS VID BÅTHAMNEN

Klubb hus Bil 13

127019

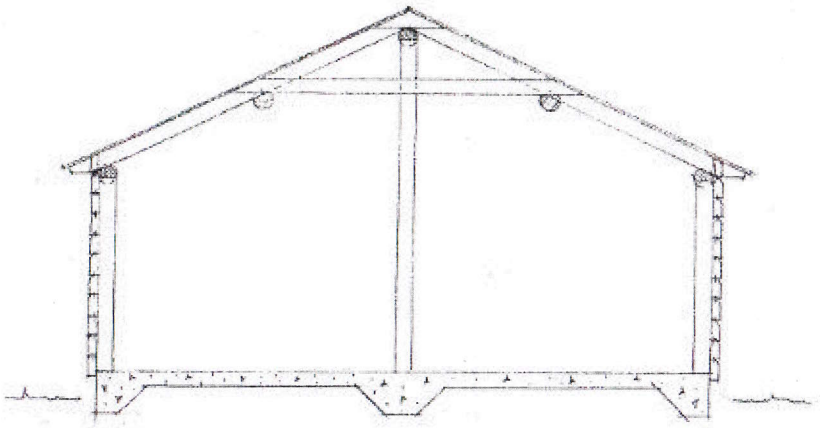

SEKTION GENOM KLUBBHUS
SKALA 1:50

TAKSTOL : REGLAR 2"×6" c/c 120 CM
PELARE : DIMENSION 7"×7"
GOLV : BETONGPLATTA

~~Godkänt av Byggnadsnämnden~~
~~den 3/12 1963 under villor som~~
~~av protokollet närmare framgår.~~
Ex officio

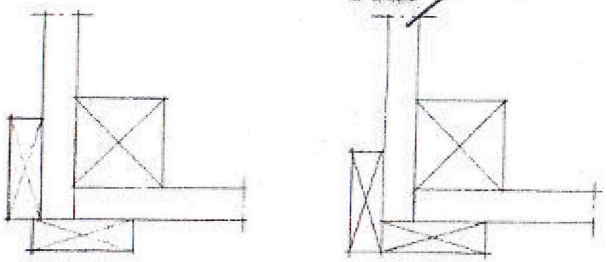

ALTERNATIV UTFORMNING AV LUCKNOT
SKALA 1:10

SVINNINGE TOMTOMRÅDE

KLUBBHUS VID BÅTHAMNEN

Klubbhus Bil 14

Karta
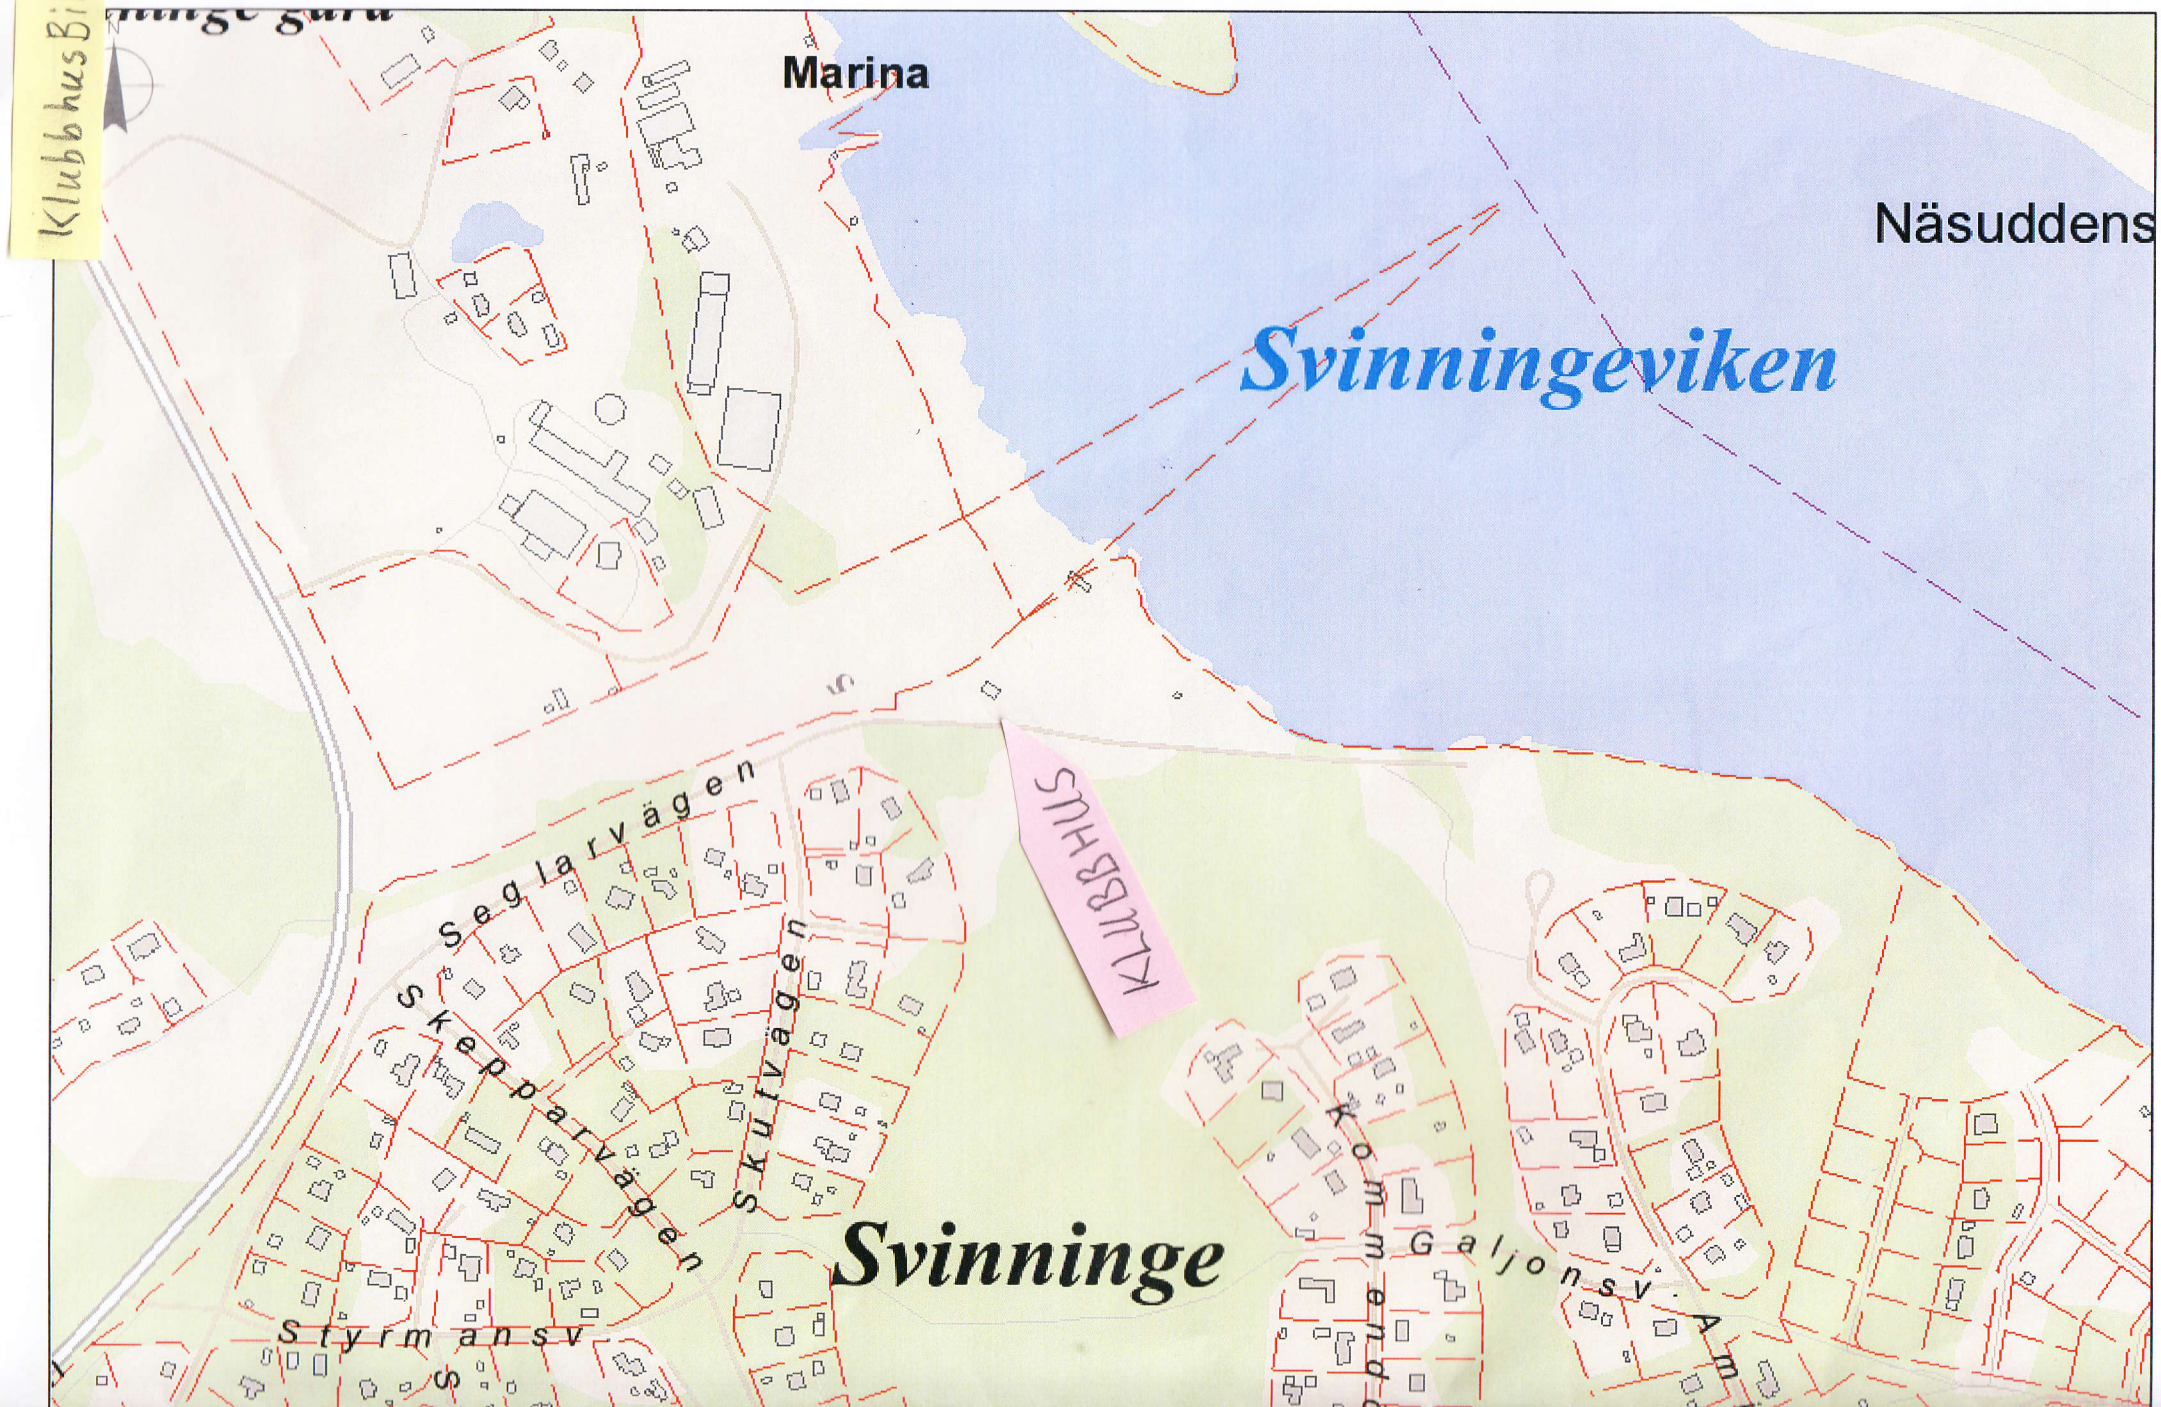
oktober 27, 2016
